

● 現在の作業状況

現在、煙突解体工事の養生足場を組立中です。  
H29年1月中旬より煙突の除染を行う予定です。




煙突養生足場組立中(平成28年12月14日 撮影)

● 工事着手前 環境調査結果

調査日 平成28年11月15・16日

環境大気

測点		ダイオキシン類	水銀	SPM	アスベスト粉じん濃度
		pg-TEQ/m <sup>3</sup>	(mg/m <sup>3</sup> )	(mg/m <sup>3</sup> )	(本/L)
①	旧工場棟北西地点	0.0068	0.0000036	0.025	0.06未満
②	旧工場棟北東地点	0.0068	0.0000025	0.028	0.06未満
③	旧工場棟南西地点	0.0068	0.0000038	0.019	0.06未満
④	旧工場棟南東地点	0.0069	0.0000047	0.03	0.06未満
環境基準		0.6以下	0.00004以下	1日平均0.1以下	10本以下

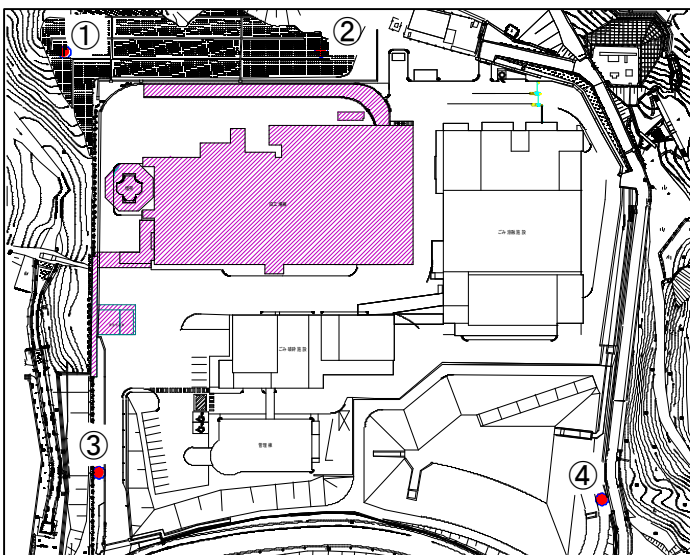

※工事開始前の周辺大気の状態が  
環境基準を満たしていることを  
確認しました。
